



**CUMPLIMIENTO DE
POLITICAS, PLANES, PROGRAMAS
Y PROYECTOS**

**INFORME DE OBRAS EJECUTADAS Y
EN EJECUCION**

DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

CANTÓN SUCRE

ING. MANUEL GILCES MERO - ALCALDE



OBRAS DE INFIMA CUANTIA

PARROQUIA	MONTO DE INVERSION
BAHIA DE CARAQUEZ	\$ 128.030,60
LEONIDAS PLAZA	\$ 207.682,43
CHARAPOTO	\$ 132.387,13
SAN ISIDRO	\$ 36.584,29
MONTO TOTAL	\$ 504.684,45



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

CANTÓN SUCRE

ING. MANUEL GILCES MERO - ALCALDE



**OBRAS CONTRATADAS A TRAVÉS DEL SERVICIO DE CONTRATACION
DE OBRAS PUBLICAS - SERCOP**

PARROQUIA	MONTO DE INVERSION
BAHIA DE CARAQUEZ	\$ 639.667,58
LEONIDAS PLAZA	\$ 104.212,39
CHARAPOTO	\$ 423.455,45
SAN ISIDRO	\$ 582.284,08
MONTO TOTAL	\$ 1.749.619,50



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

CANTÓN SUCRE

ING. MANUEL GILCES MERO - ALCALDE



RESUMEN GENERAL DE OBRAS

PARROQUIA	CONTRATO	INFIMA CUANTIA	TOTAL
BAHIA DE CARAQUEZ	\$ 639.667,58	\$ 128.030,60	\$ 767.698,18
LEONIDAS PLAZA	\$ 104.212,39	\$ 207.682,43	\$ 311.894,82
CHARAPOTO	\$ 423.455,45	\$ 132.387,13	\$ 555.842,58
SAN ISIDRO	\$ 582.284,08	\$ 36.584,29	\$ 618.868,37
MONTO TOTAL	\$ 1.749.619,50	\$ 504.684,45	\$ 2.254.303,95



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

CANTÓN SUCRE

ING. MANUEL GILCES MERO - ALCALDE



**OBRAS EJECUTADAS, EN EJECUCION Y
POR EJECUTAR CON RECURSOS
PROVENIENTES A TRAVÉS DE
CONVENIOS CON EL BANCO DEL
ESTADO, SECRETARIA NACIONAL DE
GESTION DE RIESGOS, GOBIERNO
AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE CHARAPOTO E
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO
CULTURAL REGIONAL 4 - PORTOVIEJO**


MONTO \$ 974.089,30



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

CANTÓN SUCRE

ING. MANUEL GILCES MERO - ALCALDE



#	PROYECTO	PARROQUIA	COSTO TOTAL	OBSERVACION	CONVENIO CON:
1	Protección de Taludes con Muro de Gaviones en Estero Bravo calle Valentín Alcivar	San Isidro	\$ 471.973,81	Ejecutada	Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo
2	Protección de Taludes con Muro de Escollera en la Comunidad San Ignacio	Charapotó	\$ 82.923,00	Ejecutada	Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo
3	Construcción de Muro de Gaviones para encauzamiento de la Quebrada Briones, en el Barrio Bellavista	Bahía de Caráquez	\$ 170.661,84	Ejecutada	Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo
4	Protección de Talud con muro de escollera en la Comunidad Puerto Salinas	Charapotó	\$ 128.530,65	Ejecutada	Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo
SUB - TOTAL A			\$ 854.089,30		
5	Remodelación del Parque del sitio El Pueblito	Charapotó	\$ 80.000,00	Por entrega de Anticipo	Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Charapotó
SUB - TOTAL B			\$ 80.000,00		
6	Estudios de Consultoria para la Rehabilitación y Conservación de Casas Patrimoniales en el Centro Histórico de Bahía de Caráquez	Bahía de Caráquez	\$ 40.000,00	En proceso de entrega de documentos	Instituto Nacional de Patrimonio Cultural - Regional 4 - Portoviejo
SUB - TOTAL B			\$ 40.000,00		
SUB - TOTAL A + B + C			\$ 974.089,30		



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

CANTÓN SUCRE

ING. MANUEL GILCES MERO - ALCALDE



PLAN OPERATIVO ANUAL DE CONTRATACION AÑO 2015

INVERSIÓN GENERAL

PARROQUIA	CUATRIMESTRE			
	1ER	2DO	3ER	TOTAL
BAHIA DE CARAQUEZ	\$ 107.333,33	\$ 135.262,33	\$ 42.733,33	\$ 285.329,00
LEONIDAS PLAZA	\$ 90.026,35	\$ 84.266,67	\$ 49.550,95	\$ 223.843,97
CHARAPOTO	\$ 64.382,96	\$ 115.700,00	\$ 69.700,00	\$ 249.782,96
SAN ISIDRO	\$ 52.147,78	\$ 77.600,00	\$ 72.000,00	\$ 201.747,78
MONTO TOTAL	\$ 313.890,42	\$ 412.829,00	\$ 233.984,28	\$ 960.703,71



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

CANTÓN SUCRE

ING. MANUEL GILCES MERO - ALCALDE



NIVEL DE CUMPLIMIENTO P O A - 2015

DETALLE	CUATRIMESTRE						TOTAL	
	1ER		2DO		3ER		#	%
	#	%	#	%	#	%		
OBRAS EJECUTADAS	21	75,00%	19	67,86%	12	50,00%	52	65,00%
OBRAS POR EJECUTAR	7	25,00%	9	32,14%	10	41,67%	26	32,50%
OBRAS EN EL PORTAL					2	8,33%	2	2,50%
SUMAN	28		28		24		80	100,00%

TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS

80




GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

CANTÓN SUCRE

ING. MANUEL GILCES MERO - ALCALDE



NIVEL DE CUMPLIMIENTO

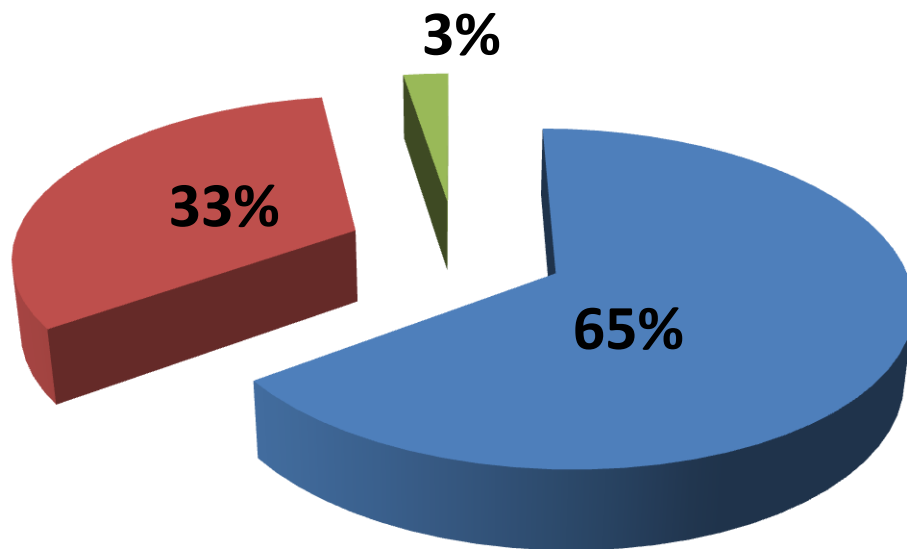

■ OBRAS EJECUTADAS

■ OBRAS POR EJECUTAR

■ OBRAS EN EL PORTAL



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

CANTÓN SUCRE

ING. MANUEL GILCES MERO - ALCALDE



**OBRAS DE ARRASTRE
(NO EJECUTADAS EN EL
AÑO 2015)**



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

CANTÓN SUCRE

ING. MANUEL GIL CES MERO - ALCALDE



BAHIA DE CARAQUEZ

1	Cancha de uso multilpe sector Ciudadela Norte	\$ 15.000,00	No se ejecutó porque existe oposición por parte de varios ciudadano por lo que se va a reubicar
2	Mejoramiento del Parque el Indio Caras	\$ 10.000,00	Se reformó para aumentar monto a \$14.000,00 - En elaboración de las Especificaciones Tecnicas
3	Colocación de señalética horizontal, vertical pasos cebras	\$ 6.800,00	No lo ejecutó la Jefatura de Tránsito porque se esta construyendo el Alcantarillado sanitario
4	Construccion de rampas de accesibilidad en varias calles de la ciudad de Bahía de Caráquez	\$ 30.000,00	No se ejecutó porque se esta construyendo el Alcantarillado sanitario
	Regeneración Urbana en el Paseo Roberto de la ciudad de Bahía de caráquez desde la Abcisa 0+174 hasta abcisa 0+310.	\$ 32.129,00	En proceso de Diseño
5	Construcción de celdas emergentes en el Botadero La Cabuya	\$ 43.200,00	En proceso para firmar convenio con el Cantón San Vicente - Se reformó para unificar con el Leonidas Plaza y para aumentar el monto a \$119.970,26
6	Estudios de Consultoria para la Rehabilitación y conservación de casas patrimoniales en el centro histórico de Bahía de Caráquez	\$ 40.000,00	Se firmó el convenio con el INPC, en proceso de realizar documentación
	TOTAL	\$ 177.129,00	

LEONIDAS PLAZA

1	Construcción de celdas emergentes en el Botadero La Cabuya	\$ 40.000,00	En proceso para firmar convenio con el Cantón San Vicente - Se reformó para unificar con el Bahía de Caraquez y para aumentar el monto a \$119.970,26
2	Construccion de muelle artesanal para pescadores sector Mangle 2000	\$ 10.000,00	Se reformó para aumentar el monto a 20.000,00 Dolares- En elaboración de diseño por la Dirección de Planificación
3	Expropiación de terreno para ampliación del cementerio general de Leonidas Plaza	\$ 20.000,00	A cargo de la Dirección de Planificación
4	Conexión de la tubería existente de agua potable a la tubería nueva en varias comunidades Santa Martha, Las Delicias, La Envidia	\$ 20.000,00	En proceso de elaboración del proyecto
5	Semaforización en la calle Stopper y Av. Cesar Ruperti.	\$ 7.000,00	Se va a reformar para realizar un distribuidor de Tráfico - Dirección de Planificación
	TOTAL	\$ 97.000,00	



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

CANTÓN SUCRE

ING. MANUEL GILCES MERO - ALCALDE



CHARAPOTO

1	Tratamiento de la Laguna de Oxidación Vía correagua	\$ 6.800,00	Se ejecuta de acuerdo a la necesidad
2	Construcción de viveros de plantas ornamentales	\$ 5.800,00	En elaboración de diseño por la Dirección de Planificación
3	Adquisición de tapas de hierro para pozos Varios Sectores	\$ 1.000,00	Se ejecuta de acuerdo a la necesidad
4	Mantenimiento y Reparación de la Estación de Bombeo Vía correagua	\$ 5.000,00	Se ejecuta de acuerdo a la necesidad
5	Expropiación de terreno para reubicación de Mercado San Jacinto	\$ 20.000,00	A cargo de la Dirección de Planificación
6	Regeneración Urbana del malecón San Clemente sector Mirador	\$ 20.000,00	Se reformó para aumentar el monto a \$44.000,00 - En proceso de elaboración de diseño
7	Construcción de cabañas cerca del Rio Viejo (Portoviejo) para la promoción de la gastronomía local	\$ 30.000,00	En elaboración de diseño por la Dirección de Planificación
8	Construcción de Facilidades Turísticas en San Jacinto en el Sector La Boca	\$ 30.000,00	En elaboración de diseño por la Dirección de Planificación
9	Colocación de señalética en las vías principales en los diferentes sectores de la Parroquia	\$ 10.000,00	A cargo de la Jefatura de Tránsito
10	Expropiación de terreno cuerpo de Bomberos Charapoto	\$ 10.000,00	A cargo de la Dirección de Planificación
TOTAL		\$ 138.600,00	

SAN ISIDRO

1	Reconstrucción de Juegos Infantiles para el Parque de San Isidro	\$ 6.800,00	POR EJECUTAR
2	Ampliación del sistema de agua entubada en la comunidad 9 de octubre	\$ 10.000,00	En elaboración de Presupuesto Referencial
3	Dotación y Mejoramiento de Agua para San Isidro	\$ 26.800,00	Se reformó y se aumento su monto a \$146.800,00 - En proceso para la elaboración de Especificaciones Técnicas
4	Dotación de Agua para la Comunidad Chimborazo	\$ 12.000,00	En elaboración de Presupuesto Referencial
5	Colocación de señalética turística en varios sectores (cascadas).	\$ 3.347,78	A cargo de la Jefatura de Tránsito
TOTAL		\$ 58.947,78	
